OR FS 108-2(11)
HAPPY TRAILS CREEK ROAD
CONTRACT NO. DTFH70-XX-C-000XX

ID	Task Name	DUR	E S	E F	L S	L F	F F	Tot. Float	Predec	Item No
1	Notice to Proceed	0d	3/27	3/27	3/27	3/27	0d	0d		
2	Aggregate Source Approval	15d	3/27	4/16	4/1	4/21	0d	3d	1	3010140101
3	Install Construction Signs	2d	3/27	3/30	3/30	3/31	0d	1d	1	63507
4	Relocate Utilities	4d	3/27	4/1	4/17	4/22	15d	15d	1	
5	Survey, Set Clearing Limits	5d	3/27	4/2	3/27	4/2	0d	0d	1	15201
6	Survey, Set C/L & Ctrl. Points	9d	4/3	4/15	4/10	4/22	5d	5d	5	15201
7	Mobilization	3d	3/27	3/31	4/17	4/21	12d	15d	1	15101
8	QA & QC Testing	75d	3/27	7/16	4/6	7/24	6d	6d	1	15101
9	Crushing	25d	4/17	5/21	4/22	5/26	0d	3d		3010140101
10	Base Aggregates	14d	4/17	5/6	4/22	5/11	0d	3d	2,7	30101
11	Pavement Aggregates	11d	5/7	5/21	5/12	5/26	0d	3d	10	40101
12	Erosion Control	73d	3/31	7/16	4/1	7/24	1d	1d	3	15703
13	Clearing and Grubbing	14d	4/3	4/22	4/3	4/22	0d	0d	5,12SS+2d	20101
14	Excavation & Embankment	25d	4/23	5/27	4/23	5/27	0d	0d	13,4,8	20401
15	Concrete Retaining Wall	13d	4/23	5/11	5/14	6/1	0d	15d		55201
16	Excavate Footing	1d	4/23	4/23	5/14	5/14	0d	15d	13	55201
17	Form & Rebar	3d	4/24	4/28	5/15	5/19	0d	15d	16	55201
18	Pour Concrete	1d	4/29	4/29	5/20	5/20	0d	15d	17	55201
19	Cure Concrete	7d	4/30	5/8	5/21	5/29	0d	15d	18	55201
20	Remove Forms & Backfill	1d	5/11	5/11	6/1	6/1	15d	15d	19	55201
21	Set Blue Tops	3d	5/28	6/1	5/28	6/1	0d	0d	14	15201
22	Finish Subgrade	4d	6/2	6/5	6/2	6/5	0d	0d	20,21	20401
23	Culverts	14d	3/31	4/17	5/19	6/5	0d	35d		60201
24	Stake Culverts	2d	3/31	4/1	5/19	5/20	0d	35d	3	15201
25	Order Culvert Materials	7d	4/2	4/10	5/21	5/29	0d	35d	24	60201
26	Install Culverts	5d	4/13	4/17	6/1	6/5	35d	35d	25	60201
27	Humphries Curve by FHWA	15d	5/7	5/27	5/18	6/5	7d	7d	10	30101
28	Mix Design Verification by FHWA	21d	5/22	6/19	5/27	6/24	3d	3d	11	40101
29	Base Aggregates--Haul, Place, Finish	13d	6/8	6/24	6/8	6/24	0d	0d	22,28,27	30101
30	July 4th Holiday	7d	7/2	7/8	7/2	6/3	0d	0d		
31	Pave	14d	6/25	7/21	6/25	7/21	0d	0d	28,29	40101
32	Permanent Striping	2d	7/22	7/23	7/23	7/24	1d	1d	31	63401
33	Install Guardrail	3d	7/22	7/24	7/22	7/24	0d	0d	31	61701
34	Install Permanent Signs	3d	7/22	7/24	7/22	7/24	0d	0d	31	63302
35	Punch List and Cleanup	4d	7/27	7/30	7/27	7/30	0d	0d	8,12,32,33,34	
36	Demobilization	2d	7/31	8/3	7/31	8/3	0d	0d	35	15101
37	Fixed Completion Date	0d	8/3	8/3	8/3	8/3	0d	0d	36	

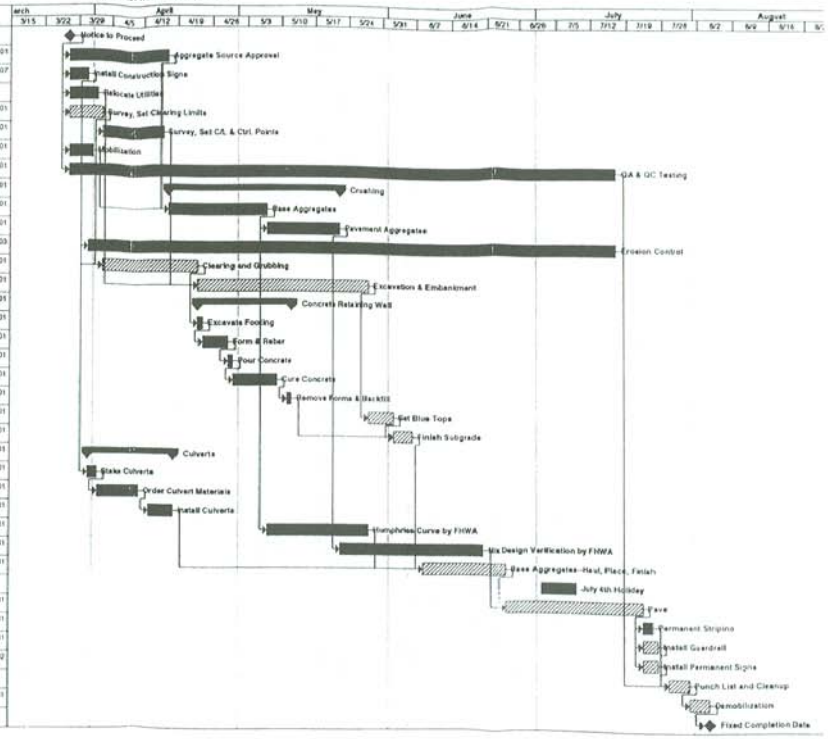

ACE CONTRACTING, INC
Date March 18, 1998

Task | Critical | Progress | Milestone | Summary | Rolled Up Milestone | Rolled Up Progress | Non-Work Period
